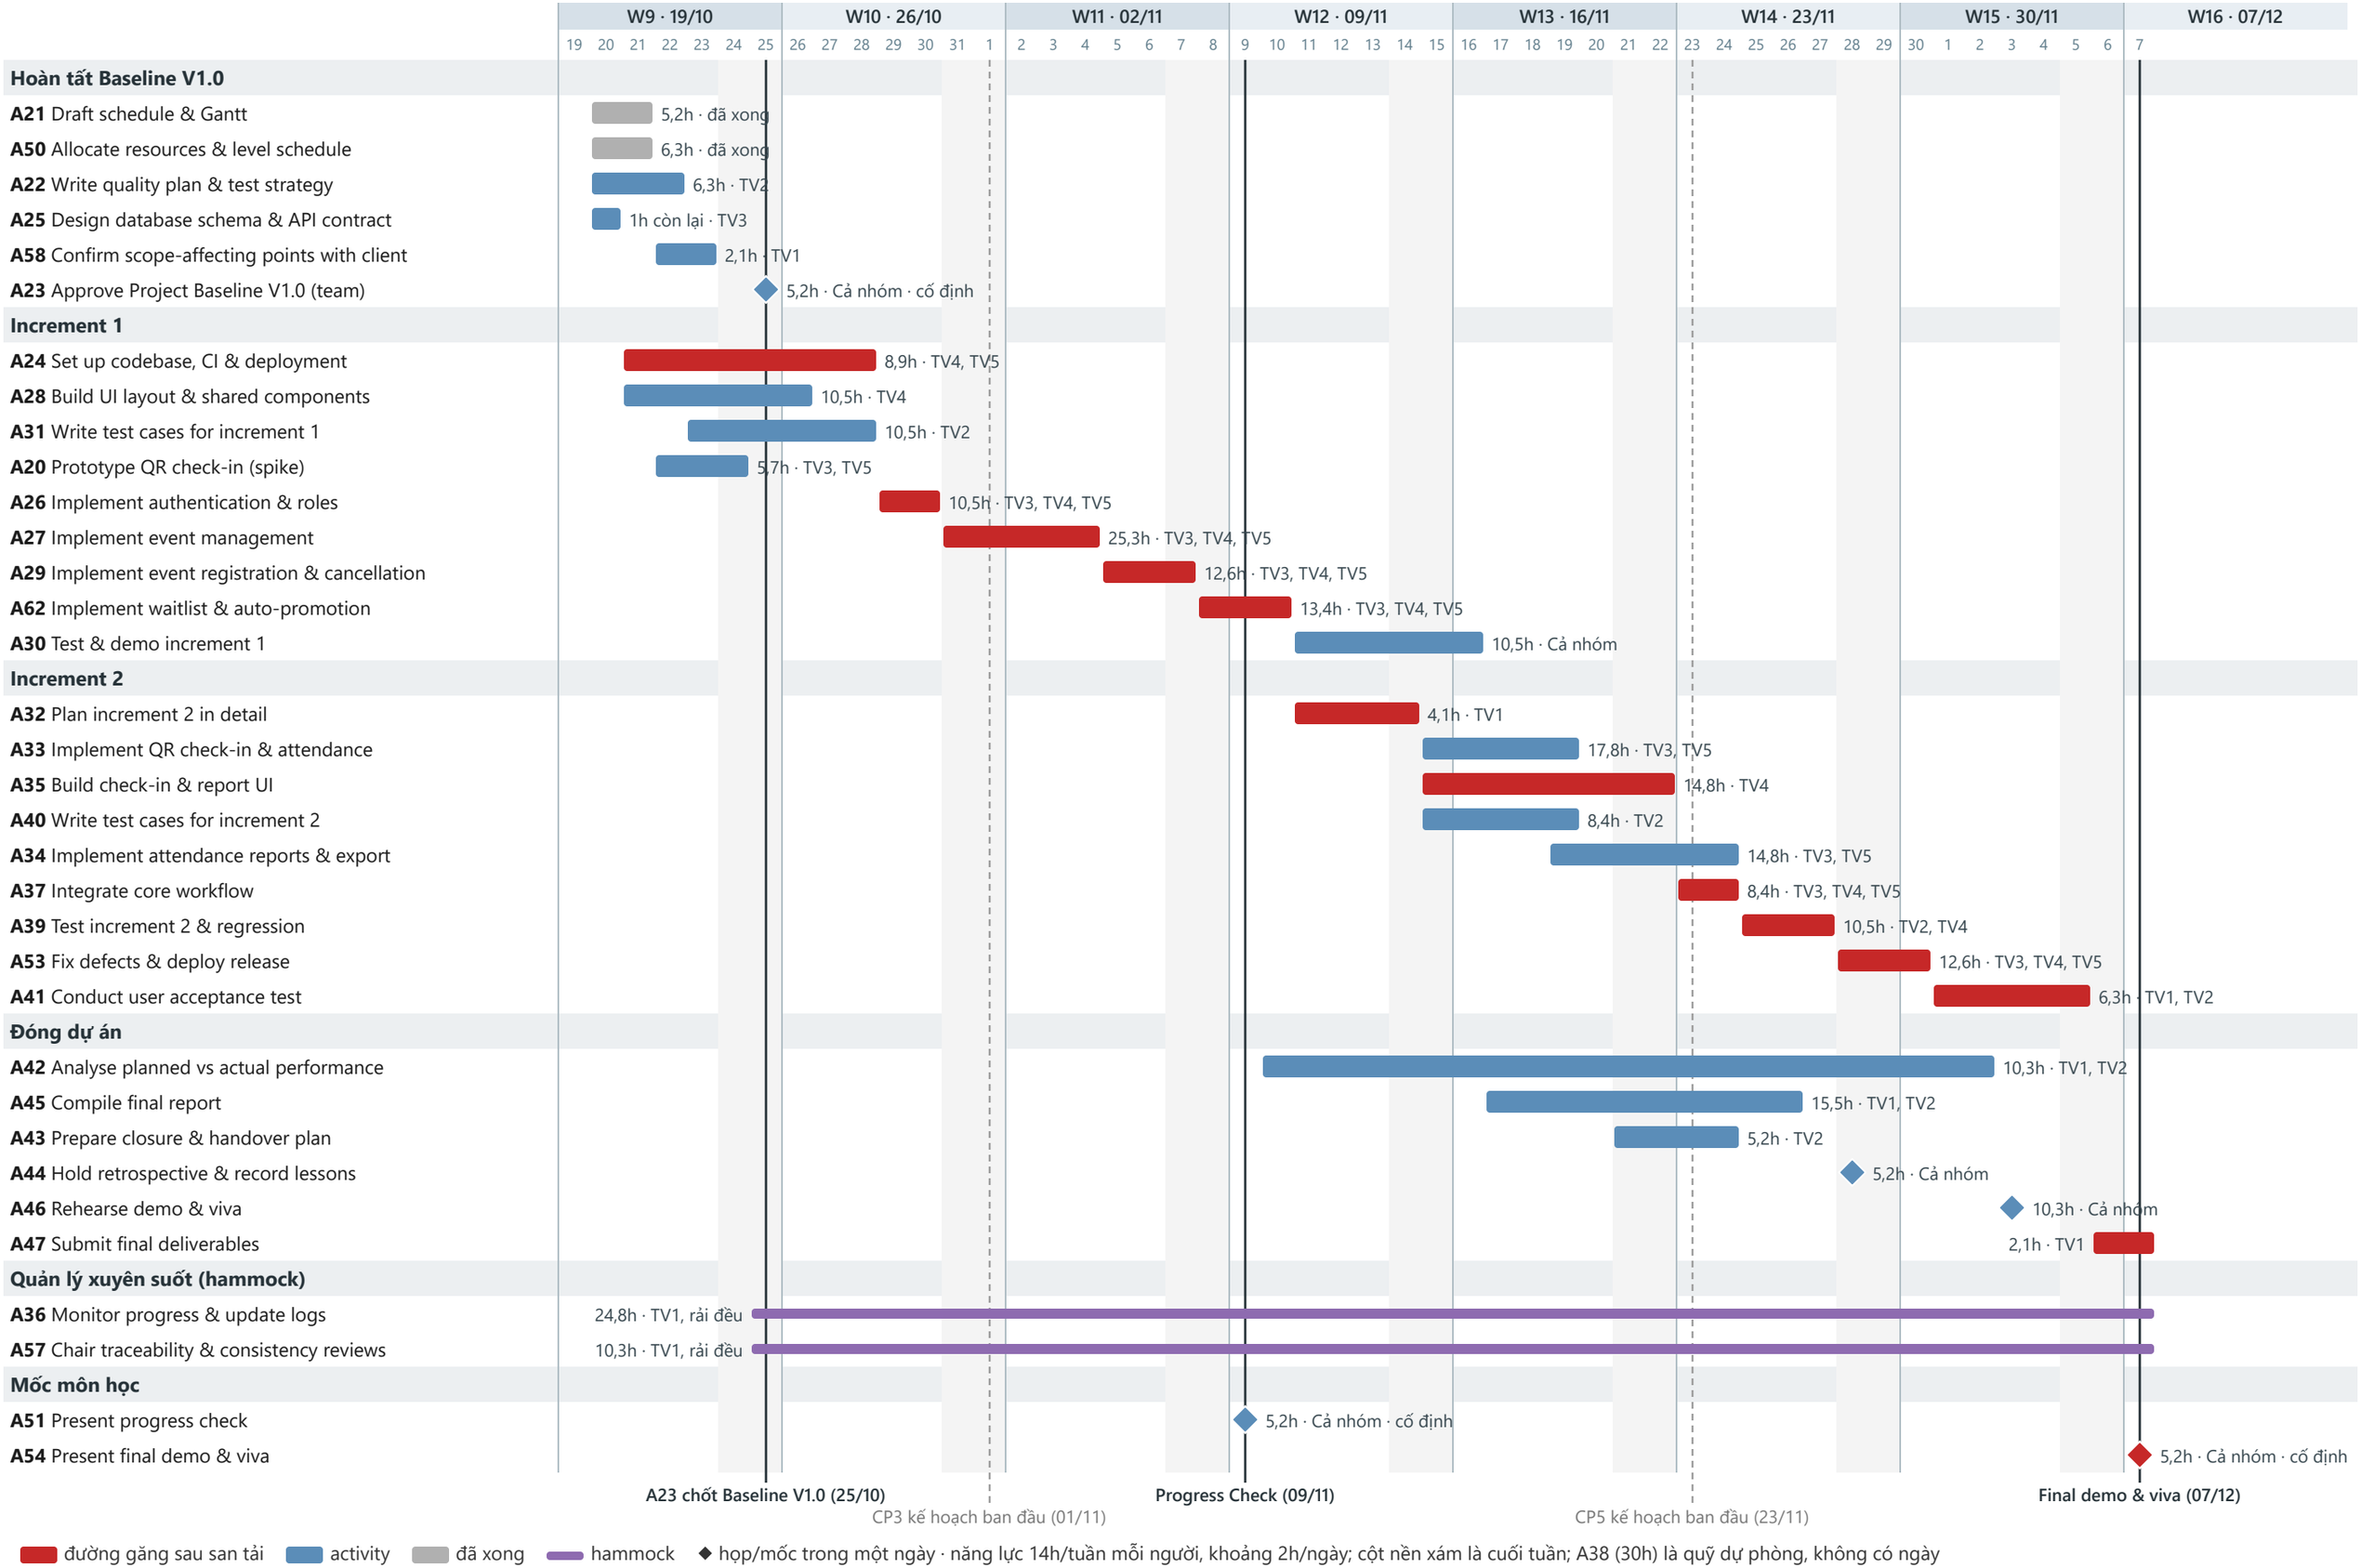

W9 · 19/10
W10 · 26/10
W11 · 02/11
W12 · 09/11
W13 · 16/11
W14 · 23/11
W15 · 30/11
W16 · 07/12
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
Hoàn tất Baseline V1.0
A21 Draft schedule & Gantt
5,2h · đã xong
A50 Allocate resources & level schedule
6,3h · đã xong
A22 Write quality plan & test strategy
6,3h · TV2
A25 Design database schema & API contract
1h còn lại · TV3
A58 Confirm scope-affecting points with client
2,1h · TV1
A23 Approve Project Baseline V1.0 (team)
5,2h · Cả nhóm · cố định
Increment 1
A24 Set up codebase, CI & deployment
8,9h · TV4, TV5
A28 Build UI layout & shared components
10,5h · TV4
A31 Write test cases for increment 1
10,5h · TV2
A20 Prototype QR check-in (spike)
5,7h · TV3, TV5
A26 Implement authentication & roles
10,5h · TV3, TV4, TV5
A27 Implement event management
25,3h · TV3, TV4, TV5
A29 Implement event registration & cancellation
12,6h · TV3, TV4, TV5
A62 Implement waitlist & auto-promotion
13,4h · TV3, TV4, TV5
A30 Test & demo increment 1
10,5h · Cả nhóm
Increment 2
A32 Plan increment 2 in detail
4,1h · TV1
A33 Implement QR check-in & attendance
17,8h · TV3, TV5
A35 Build check-in & report UI
14,8h · TV4
A40 Write test cases for increment 2
8,4h · TV2
A34 Implement attendance reports & export
14,8h · TV3, TV5
A37 Integrate core workflow
8,4h · TV3, TV4, TV5
A39 Test increment 2 & regression
10,5h · TV2, TV4
A53 Fix defects & deploy release
12,6h · TV3, TV4, TV5
A41 Conduct user acceptance test
6,3h · TV1, TV2
Đóng dự án
A42 Analyse planned vs actual performance
10,3h · TV1, TV2
A45 Compile final report
15,5h · TV1, TV2
A43 Prepare closure & handover plan
5,2h · TV2
A44 Hold retrospective & record lessons
5,2h · Cả nhóm
A46 Rehearse demo & viva
10,3h · Cả nhóm
A47 Submit final deliverables
2,1h · TV1
Quản lý xuyên suốt (hammock)
A36 Monitor progress & update logs
24,8h · TV1, rải đều
A57 Chair traceability & consistency reviews
10,3h · TV1, rải đều
Mốc môn học
A51 Present progress check
5,2h · Cả nhóm · cố định
A54 Present final demo & viva
5,2h · Cả nhóm · cố định
A23 chốt Baseline V1.0 (25/10)
Progress Check (09/11)
Final demo & viva (07/12)
CP3 kế hoạch ban đầu (01/11)
CP5 kế hoạch ban đầu (23/11)
đường găng sau san tải
activity
đã xong
hammock
◆ họp/mốc trong một ngày · năng lực 14h/tuần mỗi người, khoảng 2h/ngày; cột nền xám là cuối tuần; A38 (30h) là quỹ dự phòng, không có ngày
